

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
1/17

REV.
01

Cliente:

CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Codificação ÍCONE:
Emissão:

Codificação CESAN:

Revisão: Data de

RL-23/2018

A-050-002-92-3-SD-0001

14/08/2018

**SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLÓGICA PARA SUPORTE TÉCNICO AOS
PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTOS E OBRAS DA REGIÃO DA
GRANDE VITÓRIA E INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**AS 025 – SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - XURI – VILA VELHA-ES**

RELATÓRIO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA

AGOSTO/2018

DSoares Empreendimentos e Construções Eireli

Rua: Raimundo Correia 52, São Pedro – Belo Horizonte – MG CEP 30330-090
Fone/Fax: (31) 2534-1988 - www.dsoares.com.br

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
2/17

REV.
01

RELATÓRIO: Sondagem à Percussão

LOCAL: Vila Velha-ES.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2018.

À

Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Prezados Senhores:

Atendendo solicitação de V.Sas., estamos apresentando os resultados das sondagens de **09 pontos de sondagem a percussão, totalizando 139,05 metros de perfuração.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DSOares Empreendimentos e Construções
Engº. Civil – Hermínio Siqueira Virgíneo
CREA/MG 31007/D

 DSOares EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	 CESAN qualidade em saneamento	
RELATÓRIO TÉCNICO INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA	Nº DE contrato 187/2017	FOLHA 3/17
		REV. 01

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. MÉTODOS UTILIZADOS	5
3. EQUIPAMENTOS	5
3.1 EXECUÇÃO DO ENSAIO	6
3.1.1 PROCESSO DE PERFURAÇÃO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA)	6
3.1.2 AMOSTRAGEM.....	6
3.1.3 ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINAMICA	6
3.2 OBSERVAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA FREÁTICO	6
3.3 PROFUNDIDADES DAS PERFURAÇÕES.....	6
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.....	7
4.1 QUADRO RESUMO DA SONDAGEM	8
5 RELATORIO FOTOGRAFICO	9
6 ANEXOS	13

		
RELATÓRIO TÉCNICO INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA	Nº DE contrato 187/2017	FOLHA 4/17
		REV. 01

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório faz parte das atividades de sondagem a trado realizada pela empresa DSoares Empreendimentos e Construção EIRELI, a pedido da solicitante CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento conforme contrato nº 187/2017, referente à prestação de serviços de Sondagem Geológica para suporte Técnico aos Projetos de Engenharia, Orçamentos e Obras da Região da Grande Vitória e no Interior do Estado do Espírito Santo.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço **A.S. 025 – SONDADEM A PERCUSSÃO PARA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - XURI – VILA VELHA-ES.**

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
5/17

REV.
01

2. MÉTODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realização dos serviços procuram seguir ao máximo o método se ensaio NBR 6484/fev2001 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio.

3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

- torre com roldana e sarilho;
- tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67mm e diâmetro nominal externo de 76mm;
- haste de lavagem/penetração em aço com diâmetro nominal interno de 25mm e massa teórica de 3.23kg/m;
- amostrador padrão de diâmetro externo de 50,8mm e diâmetro interno de 34,9mm;
- cabeça de bater em aço;
- trépano;
- trado concha com (100±5)mm de diâmetro;
- trado helicoidal com diâmetro entre 67mm e 73mm;
- medidor de nível de água;
- bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.

		
RELATÓRIO TÉCNICO INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA	Nº DE contrato 187/2017	FOLHA 6/17
		REV. 01

3.1 EXECUÇÃO DO ENSAIO

3.1.1 PROCESSO DE PERFURAÇÃO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA)

O processo de perfuração foi iniciado com o emprego do trado até o nível de água do subsolo ou inviabilidade de avanço com sua utilização, ou seja, avanços inferiores a 50mm após 10 min. de operação. A partir desse ponto a perfuração.

3.1.2 AMOSTRAGEM

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador padrão. As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes próprios hermeticamente fechados e foram encaminhadas para identificação tátil-visual no laboratório de mecânica de solos da empresa DSoares Empreendimentos e Construção.

3.1.3 ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65kg da altura de 75cm, até se atingira a penetração de 0,45m, anotando-se o número de golpes necessários a cravação de cada 0,15m do referido amostrador padrão, ou conforme orientação da Norma Brasileira NBR – 6484/fev2001.

3.2 OBSERVAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA FREÁTICO

Foram realizadas determinações do nível d'água freático conforme o método de ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/fev2001. Os resultados dessas determinações estão apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3.3 PROFUNDIDADES DAS PERFURAÇÕES

A profundidade das perfurações, para todos os furos, foi definida conforme critérios de paralisação estipulados em Norma Técnica.

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
7/17

REV.
01

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Período dos Trabalhos

08/08/2018 a 14/08/2018

Locação das Sondagens

A quantidade de sondagem foi definida pelo contratante assim como suas posições dentro da área estudada.

Quadro Resumo da Sondagem

Os perfis individuais dos furos de sondagem estão apresentados em anexo e contam com todas as informações coletadas em campo. Conforme se pode observar nos perfis individuais, a quantidade total de **09(nove) furos de sondagem totalizando 139,05 metros perfurados**, conforme perfis a seguir.

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
8/17

REV.
01

4.1 QUADRO RESUMO DA SONDAGEM

LOCAL	QTD FURO	Nº FURO	DATA TERMINO	PROFUNDIDADE		
				SOLO	ROCHA	TOTAL
CESAN – ETE XURI PENITENCIARIA	01	SP – 01	08/08/2018	15,45		15,45
	02	SP – 02	09/08/2018	15,45		15,45
	03	SP – 03	10/08/2018	15,45		15,45
	04	SP – 04	10/08/2018	15,45		15,45
	05	SP – 05	11/08/2018	15,45		15,45
	06	SP – 06	11/08/2018	15,45		15,45
	07	SP – 07	13/08/2018	15,45		15,45
	08	SP – 08	13/08/2018	15,45		15,45
	09	SP – 09	14/08/2018	15,45		15,45
TOTAL				139,05		

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
9/17

REV.
01

5 RELATORIO FOTOGRAFICO



**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
10/17

REV.
01



**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
11/17

REV.
01



**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
12/17

REV.
01



DSoares Empreendimentos e Construções Eireli

Rua: Raimundo Correia 52, São Pedro – Belo Horizonte – MG CEP 30330-090
Fone/Fax: (31) 2534-1988 - www.dsoares.com.br

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
13/17

REV.
01

6 ANEXOS

- Perfis de sondagem à percussão
- Planta de locação


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
14/17

REV.
01

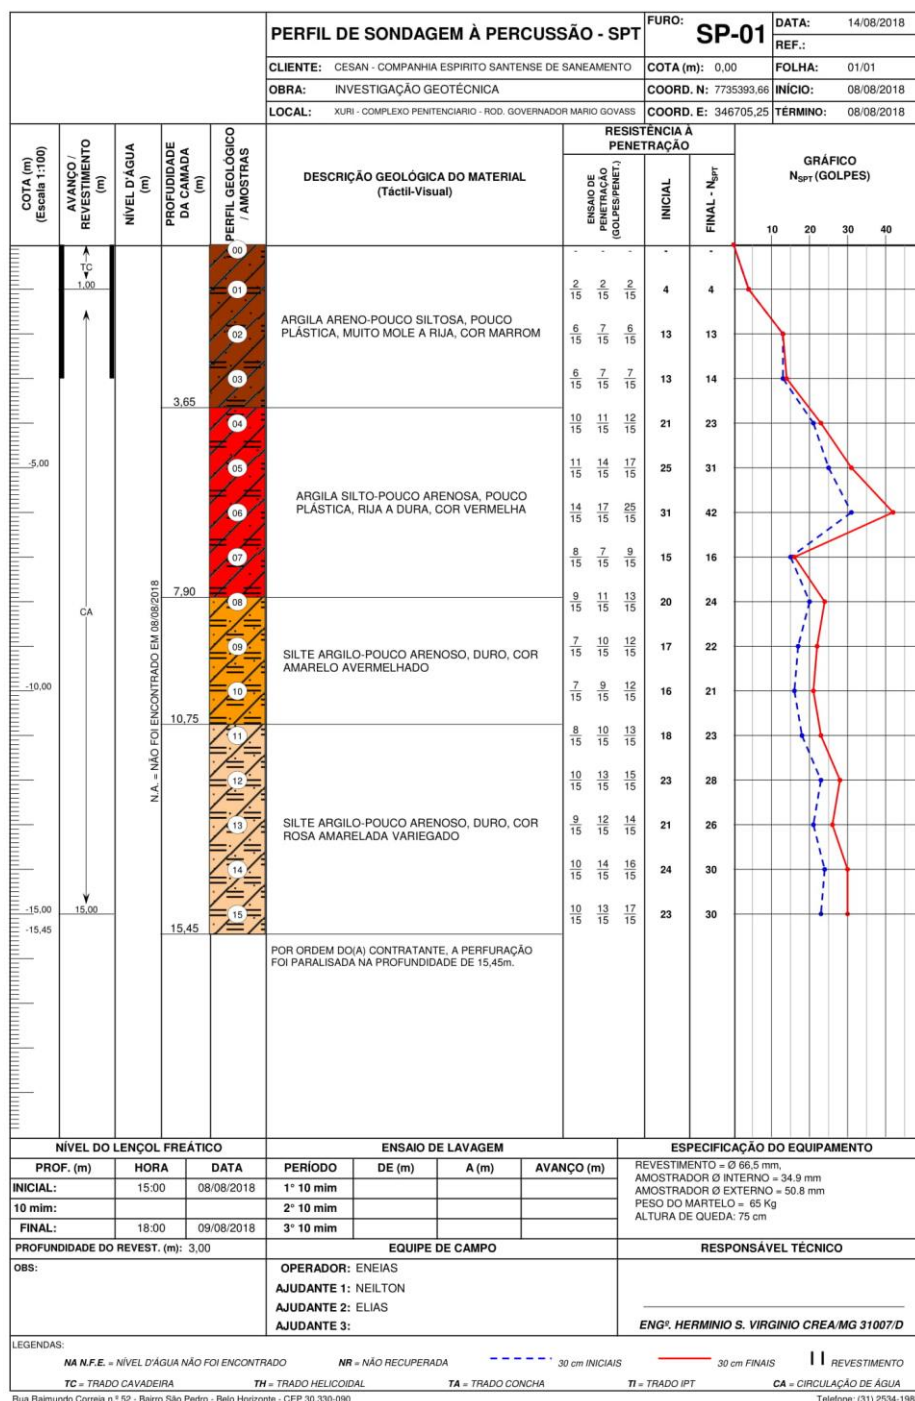


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
15/17

REV.
01

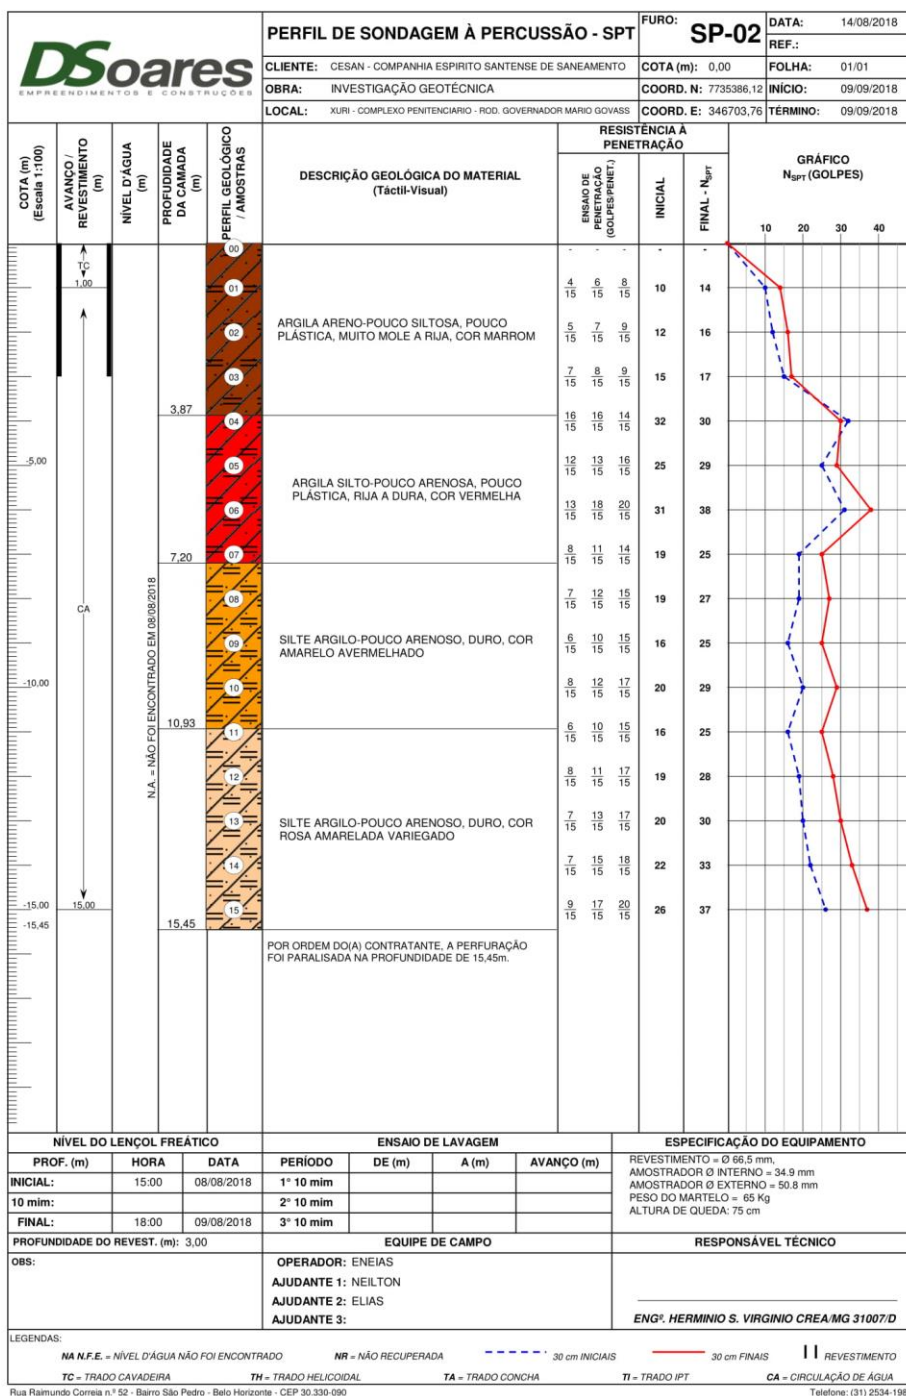


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
16/17

REV.
01

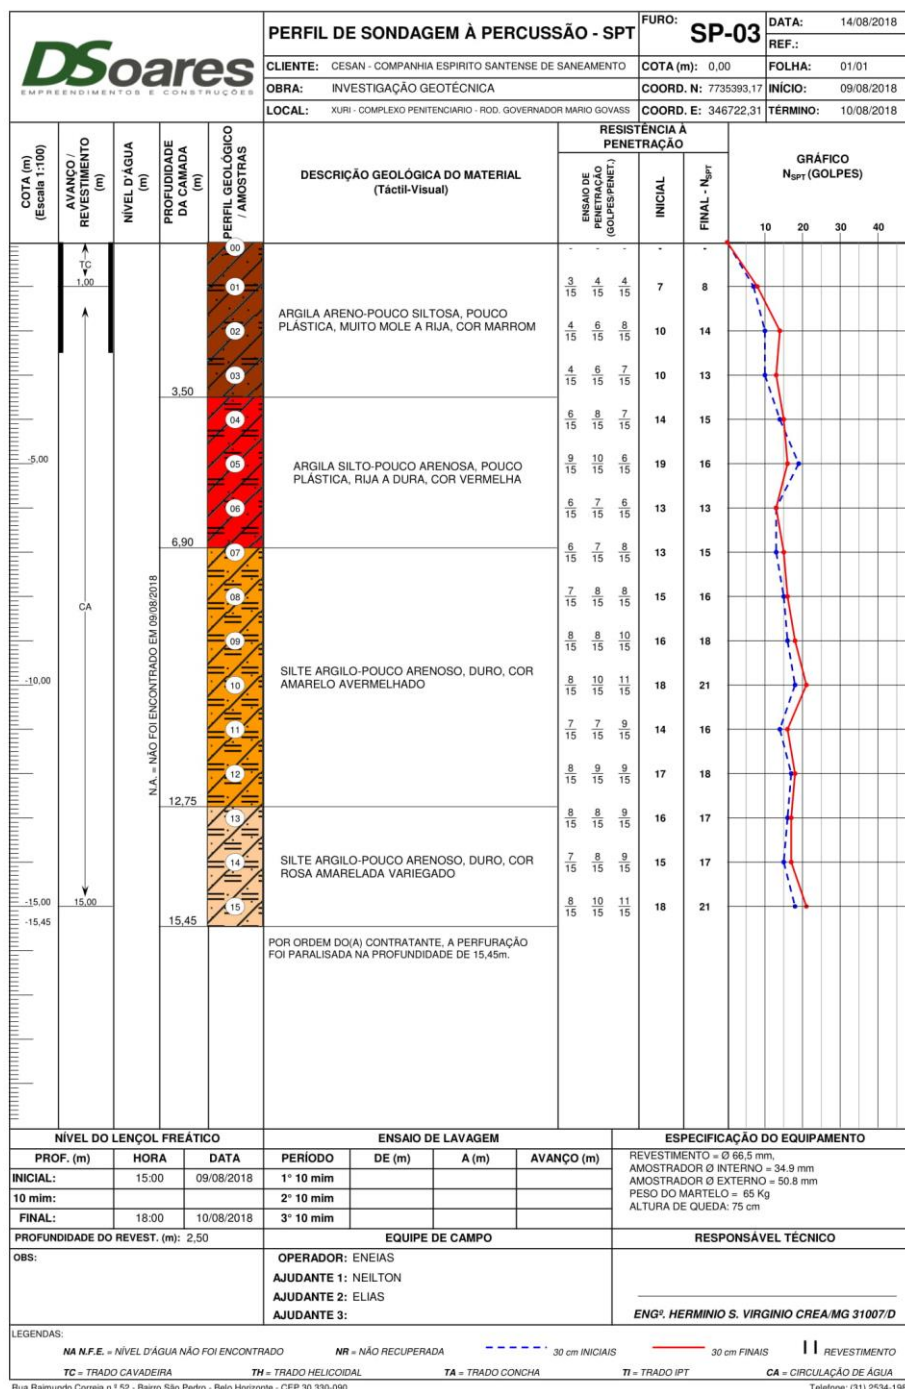


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
17/17

REV.
01

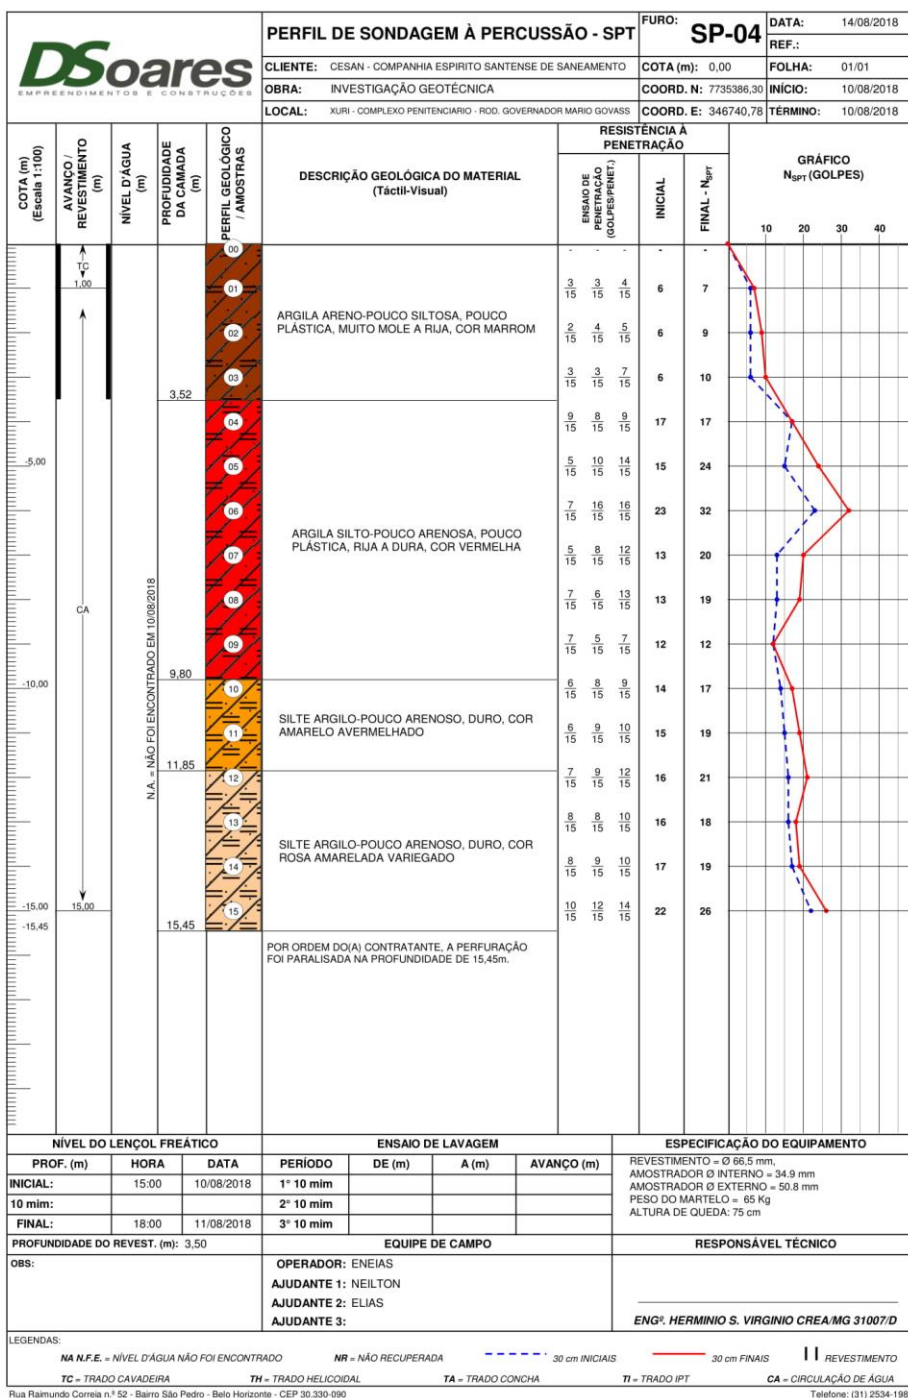


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
18/17

REV.
01

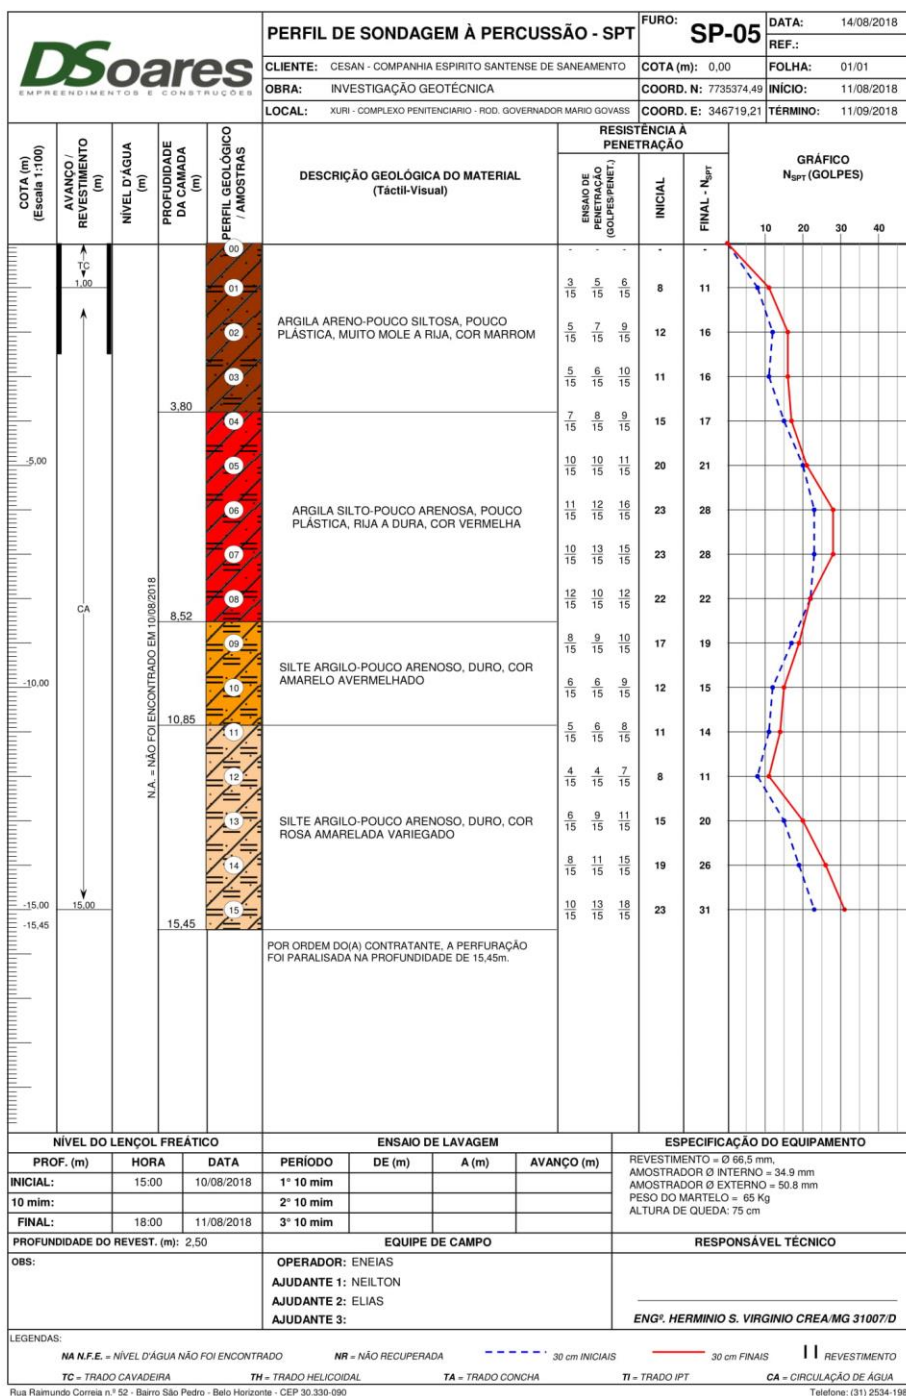


RELATÓRIO TÉCNICO INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
19/17

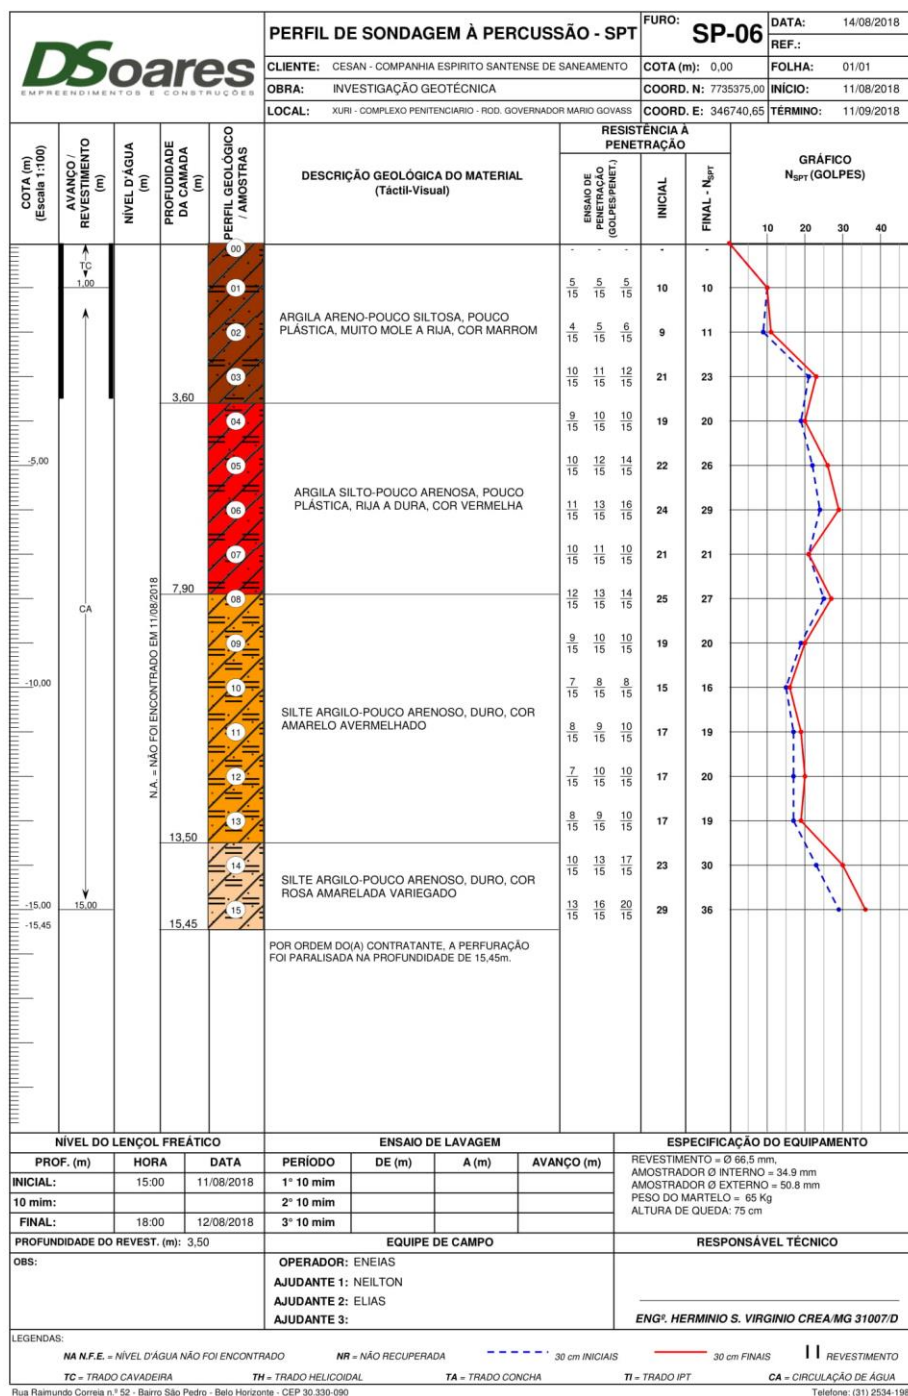REV.
01


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
20/17

REV.
01

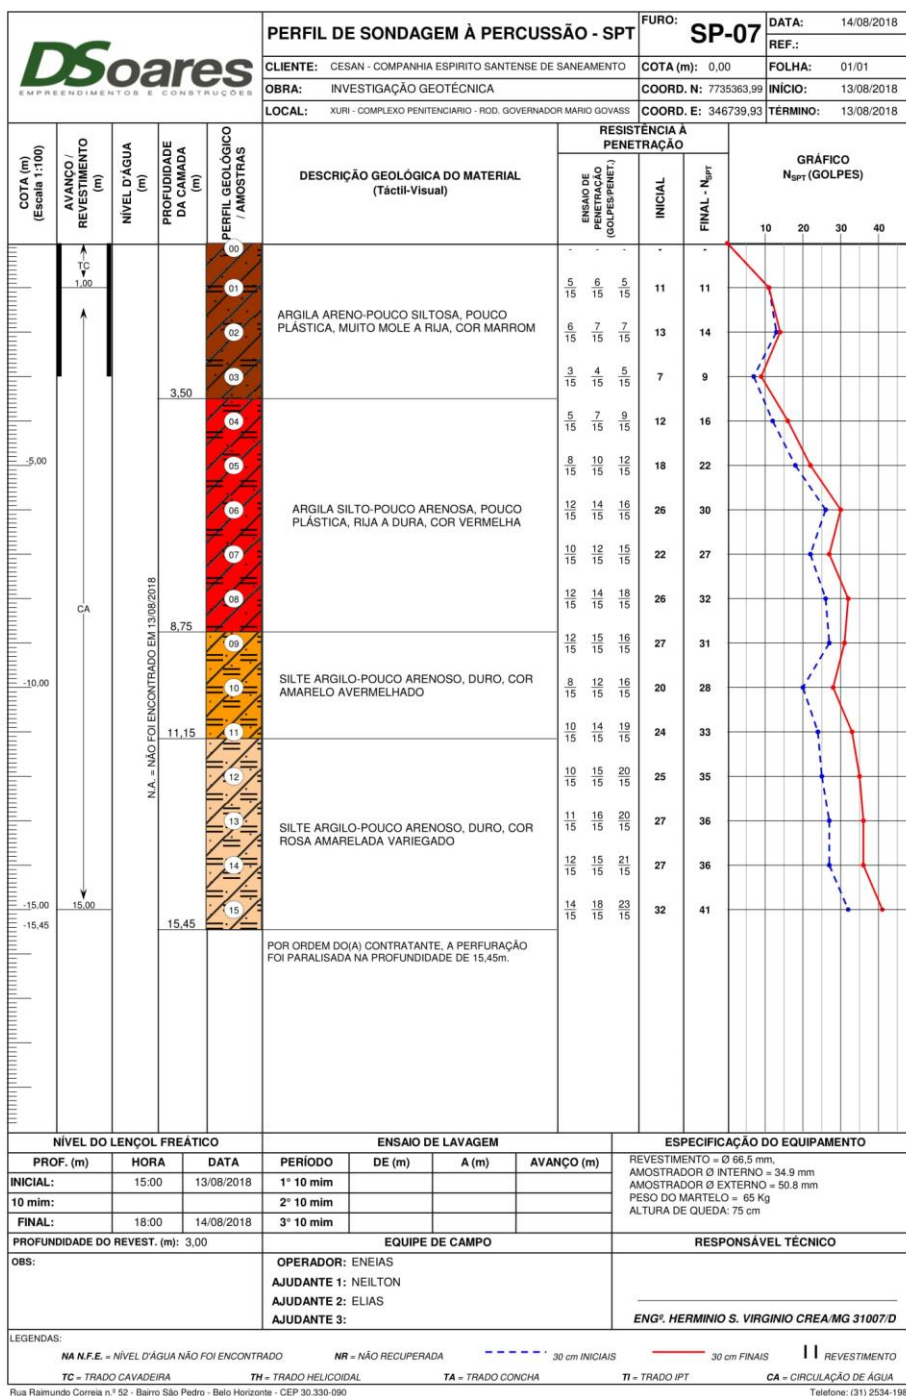


**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
21/17

REV.
01

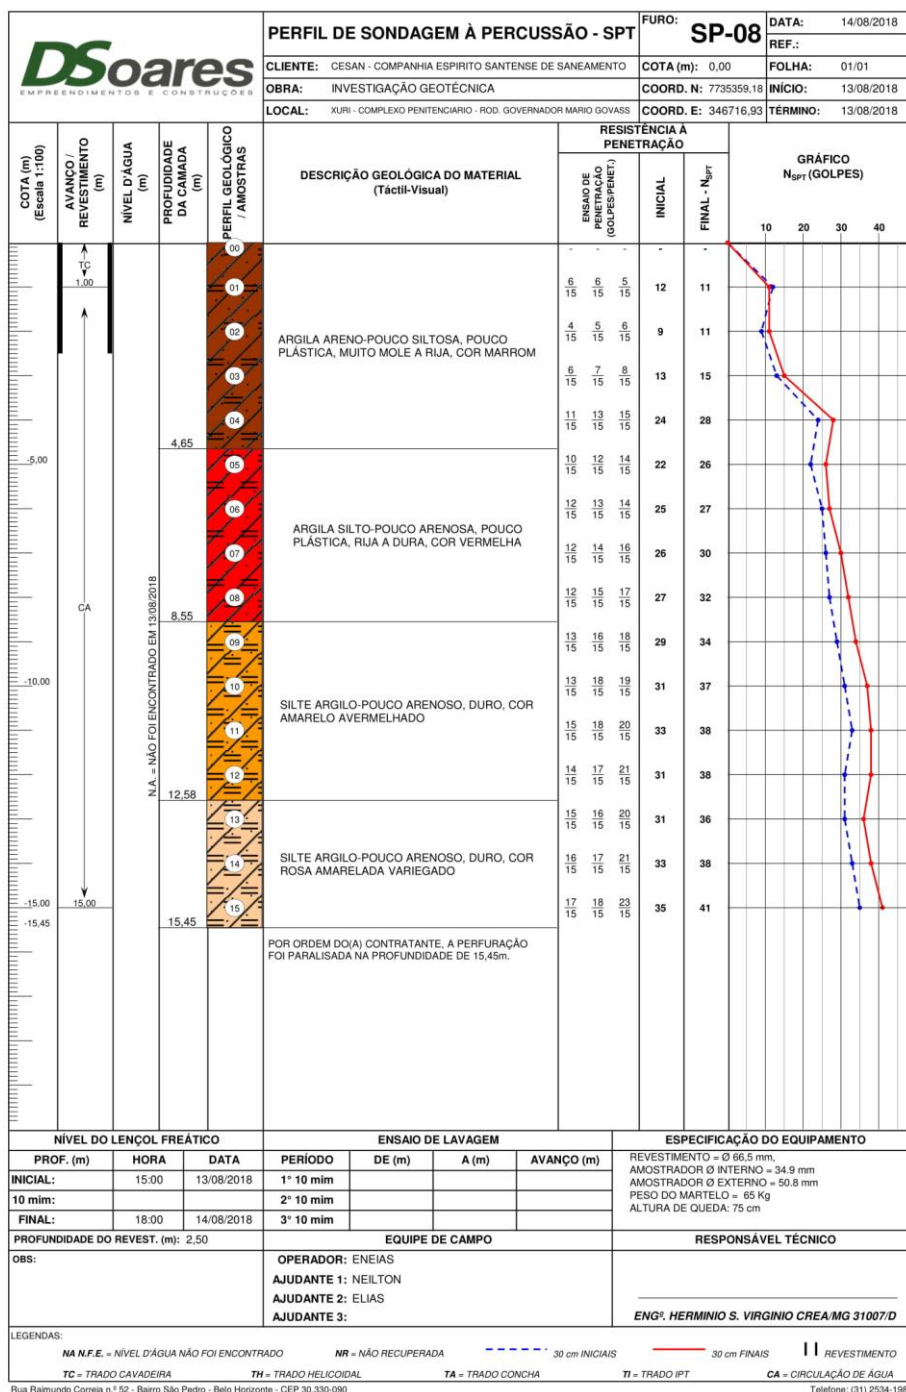

**RELATÓRIO TÉCNICO
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

Nº DE contrato

187/2017

FOLHA
22/17

REV.
01

